


Talotekniikan kumppanivalinnat käynnissä

Allianssin hankintojen osalta kuluvalle viikolla on valmisteltu merkittäviä talotekniikkatöiden hankintakokonaisuuksia. Aliurakoitsijavalinnat ko. hankintojen osalta on tavoitteena saada suoritettua loppuun helmikuun alkupuolella.

Työmaalla käynnissä olevia työvaiheita ovat A-lohkolla porrassasennukset 1.–2. kerroksessa, väliaikaisten suojaseinien teko sekä sisätäyttö- ja viemäriasennustyöt. B-lohkolla käynnissä on kaukolämpölinjan sulatus ja asennustyöt sekä 1. kerroksen katon loppujen onteloiden asennus. C-lohkolla tehdään väestönsuojien lattiarauoituksia ja valuja sekä maapaineseinien nostoja.

Ensi viikolla tehdään A-lohkolla 2. kerroksen katon ontelolaattojen saumavaluja sekä jatketaan suojaseinien tekoa ja sisätäyttö- ja viemäriasennustöitä. B-lohkolla käynnistetään 2. kerroksen seinäelementtien asennustyöt. C-lohkolla aloitetaan väestönsuojaseinien muottityöt ja anturatöitä.

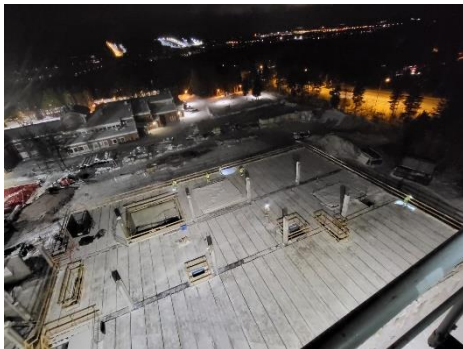

A-lohkon onteloasennuksia



Runkotöiden lohkojako

Työmaan turvallisuusmittauksen tulos viikolta 2 oli 98,29 %. Työmaalla on työskennelty 193 päivää tapaturmitta.

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu
